

관리번호 53	민선시대 성공정책 승계(회전교차로 읍면동 확대)				
완료구분	임기내	사업주체	김제시	추진상황	정상추진
예산구분	5,200백만원	신규여부	지속사업	추진부서/팀 담당자	건설과 / 도로계획팀 윤경길 (☎ 3793)

□ 추진방향 및 목표

- 시내구간에 집중되어있는 회전교차로를 읍·면·동지역으로 확대 실시하여 소재지 접근성을 향상
- 기존 신호등 체계로 이뤄지는 교차로에 비해 유지관리 비용 절감 및 교통사고 저감으로交通安全 수준 향상
- 통행 차량 정차 최소화로 배기가스 및 연료 소모 감소에 따른 녹색교통 실현 및 에너지 절감에 기여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년(5년)
- 사업비 : 5,200백만원(도비 700, 시비 4,500)
- 사업내용 : 읍·면·동 회전교차로 설치 9개소
- 기타 : 회전교차로 설치구간에 대한 도로교통공단 검토 필요

□ 자원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22		'23		'24		'25	'26	'26 이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	계획	계획
계	5,200	2,560	1,200	1,200	1,000	1,360	1,000	400	1,000	1,000	
국비											
도비	700	650	140	140	140	510	140	200	140	140	
시비	4,500	1,910	1,060	1,060	860	850	860	200	860	860	
기타											

□ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
회전교차로 설치	목표(건수)	1	2	2	2	2
	실적(건수)	1	2			
	달성률(%)	100	100			


□ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2022	○ 실시설계 추진 ○ 원가심사 및 공사 시행	○ 실시설계 준공 ○ 원가심사 완료 및 공사 착공
2023	○ 실시설계 추진(원평,관기)	○ 실시설계 용역 착수 ○ 관련부서 사전협의(도로교통공단)
	○ 실시설계 추진(원평,관기)	○ 주민설명회 개최 ○ 관련부서(실과소 및 경찰서, 도로교통공단 등) 협의
	○ 토지 및 지장물 보상협의 ○ 관련부서(전라북도) 협의	○ 토지 및 지장물 보상협의 ○ 관련부서(전라북도) 협의 ○ 공사 준공(교통사거리)
	○ 사전행정절차이행(비관리청 변경허가 추진) ○ 토지수용을 위한 전라북도 협의	○ 사전행정절차이행(비관리청 변경허가 완료) ○ 토지수용을 위한 전라북도 협의

금후 추진계획(로드맵)


구 분	추진계획	비 고
2024 1분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 착공(원평사거리 회전교차로) ○ 사전 행정절차 이행(중앙토지수용위원회 및 관련기관 협의) (관기사거리 회전교차로) 	
2024 2분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 준공(원평사거리 회전교차로) ○ 사전 행정절차 이행(토지 수용재결 절차, 비관리청 공사 시행) (관기사거리 회전교차로) 	
2024 3분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 착수(관기사거리 회전교차로) ○ 2025년 회전교차로 사업대상지 검토 	
2024 4분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 준공(관기사거리 회전교차로) ○ 2025년 회전교차로 사업대상지 선정 	
2025 이후	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 준공(관기사거리 회전교차로) ○ 2025년 회전교차로 사업 착수 	

증빙자료

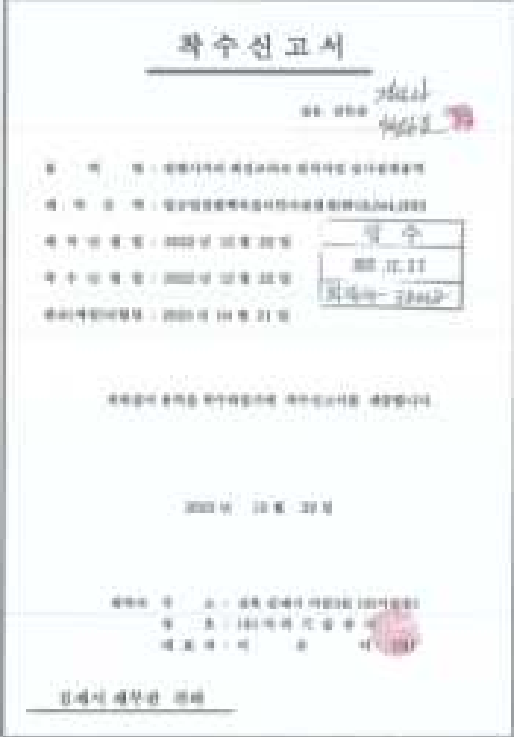	
<p>공사 착공('22.12.6.)(교통사거리)</p>	<p>실시설계 착수('22.12.22.)(원평사거리)</p>
	
<p>실시설계 착수('23.2.20.)(관기사거리)</p>	<p>관련부서 협의('23.3.20.)(도로교통공단)</p>

[illegible]

주민설명회('23.5.31.)(원평사거리)



서울특별시

서울특별시


준공(납품)검사조서

공사명 (계약명)	교통사고자 피전문자로 철거사업 준공(납품)검사조서				
도청자	(주)장선 대표 김원민				
계약금액	금619,600,000원(삼육목 일경구백목일만원)				
계약	2022년 12월 2일	준공(납품)기한	2023년 9월 8일		
착공(착수)	2022년 12월 8일	준공(납품)일	2023년 9월 8일		
준공(납품)검사	2023년 9월 20일				
참고	감독조서 및 준공서면 각1부.				

별제 설계서 및 도면(과업지시서)에 의하여 위와 같이 준공(납품)검사를 행하였음.

2023년 9월 일

검사관 소속 관청과 도표제책된 적 지방시설주사 성명 김 피 관



서울특별시

서울특별시

김 제 시

수신 전라북도지사(도무중합청도과장)

(경무)


해곡 비관리청공사 시행 변경허가 신청(철거사고자 피전문자로 철거사업)

1. 위 기관의 무효한 발현을 기원합니다.

2. 김제시 지방도 736호선에 위치한 철거사고자 피전문자로 철거사업을 시행함에 따라 불합과 같이 비관리청공사 변경허가 신청서를 제출하였으나 원도 후 확인하여 주시길 바랍니다.

붙임 1. 비관리청공사 변경허가 신청서 1부

2. 관련서류 1식(별도송부) 끝.



김 제 시 장

주관부

담당부

전화번호

담당자

담당자 직위

담당자 직위

주관부

담당부

전화번호

담당자

담당자 직위

담당자 직위

시행 전일제-011715

주 54555 전라북도 김제시 중앙로 40, 1층청사 / <http://www.gjps.go.kr>

전화번호 093-542-0793 팩스번호 093-542-3440 / ksd011715@kps.go.kr / ksd011715@kps.go.kr

교정 주창1 조윤 주창하는 김제

공사 준공('23.09.20.)(교통사거리)
