관리번호 10								
완료구분	임기내	사업주체	김제시	추진상황	정상추진			
예산구분	211,232백만원	신규여부	지속사업	추진부서/팀 담당자	건설과 / 농업기반팀 김범상 (53 3848)			

□ 추진방향 및 목표

- O 용배수로 현대화를 통한 원활한 농업용수 공급
 - 토사 용배수로 정비(개거 및 수로관 설치)
- O 수리시설개보수 사업을 통한 농업용수 확보
- 영농규모화 확대에 따른 기계화경작로(농로) 확포장공사 수요 증가
- O 국가예산 확보를 통한 영농편의 증진
 - 금강지구 영농편의 증진사업
 - 타작물(죽산 대창・종신리, 광활 옥포・창제리) 배수개선사업

□ 사업개요

O 사업기간 : 2022 ~ 2026년

○ 위 치 : 김제시 관내(19개 읍면동)

O 사 업 비 : 211,232백만원

O 사업내용

- 용·배수로 선진화 사업 : 용·배수로 정비 147.2km(36.8km/년)

- 수리시설개보수 사업: 저수지 개보수(관내 100개소), 관정개발 등

- 기계확경작로(농로) 확포장공사 104km(26km/년)

- 영농편의 증진사업(신규사업_한국농어촌공사)

▶ 금강지구 영농편의 증진사업 : 2,370ha 경지재정리사업, 밭기반사업 등

▶ 타작물(죽산 대창·종신리, 광활 옥포·창제리) 배수개선시업 : 배수로정비 12.1km

□ 재원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22		'23		'24		'25		'26	'26 이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	神 神
계	211,232	129,552	17,915	27,823	22,389	23,811	33,409	33,409	47,395	44,509	32,084	58,040
국비	122,472	51,872	1,850	1,850	5,522	5,522	15,700	15,700	28,800	28,800	25,600	45,000
도비	4,045	5,938	733	733	769	2,191	807	807	847	2,207	249	640
시비	84,715	71,742	15,332	25,240	16,098	16,098	16,902	16,902	17,748	13,502	6,235	12,400
기타												

□ 공약달성 확인지표

구분	'22	′23	'24	'25	'26	
농업생산기반시설 선진화	목표(%)	12	14	22	31	21
	실적(%)	12	14	22	29	
(예산확보 및 집행률	달성률(%)	100	100	100	94	


□ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항 (실적)				
2022	○ 용·배수로 정비공사 18.4km ○ 기계화경작로(농로) 확포장공사 13km ○ 수리사설(저수지) 개보수 사업 6개소 ○ 타작물 배수개선사업 신규사업 추진	○ 용·배수로 정비공사 18.4km 완료 ○ 기계회경작로(농로) 확포장공사 13km 완료 ○ 수리사설(저수지) 개보수 사업 6개소 준공 ○ 타작물 배수개선사업 신규사업 착수				
2023	○ 용·배수로 정비공사 26.5km ○ 기계화경작로(농로) 확포장공사 13km ○ 수리시설(저수자관정) 개보수 시업 완료 ○ 타작물 배수개선사업 완료	○ 용·배수로 정비공사 6.5km ○ 기계화경작로(농로) 확포장공사 1km ○ 수라시설(저수지) 개보수 시업 6개소 ○ 타물 배쉬(산)업신규사업기본계획 수립				
2024	 ○ 용·배수로 정비공사 10km ○ 수리시설(저수자관정) 개보수 사업 추진 ○ 기계화경작로(농로) 확포장공사 1.5km ○ 타작물 배수개선사업 추진(국비확보 및 사업추진) 	○ 용·배수로 정비공사 10km 완료 ○ 수리시설(저수자관정) 개보수 시업 완료 ○ 기계회(장보)(농로) 확포장공사 1.5km 완료 ○ 타작물 배수개선사업 추진(국비 확보 및 사업추진)				
2025 (1~3분기)	○ 용·배수로 정비공사 26km ○ 기계화경작로(농로) 확포장공사 19km ○ 수리사설(저수자관정) 개보수 사업 추진 ○ 타작물 배수개선사업 추진	○ 용·배수로 정비공사 26km ○ 기계화경작로(농로) 확포장공사 19km ○ 수리시설(저수지관정) 개보수 시업 추진 ○ 타작물 배수개선사업 추진				


□ 금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비	고
2025 4분기	○ 용·배수로 정비공사 1.6km ○ 수리시설(저수지·관정) 개보수 사업 추진 ○ 기계화경작로(농로) 확포장공사 0.5km ○ 타작물 배수개선사업 추진(국비 확보 및 사업추진)		
2026 이후	○ 용·배수로 정비공사 27.6km ○ 수리시설(저수지·관정) 개보수 사업 추진 ○ 기계화경작로(농로) 확포장공사 19.5km ○ 타작물 배수개선사업 추진(국비 확보 및 사업추진)		

] 증빙자료

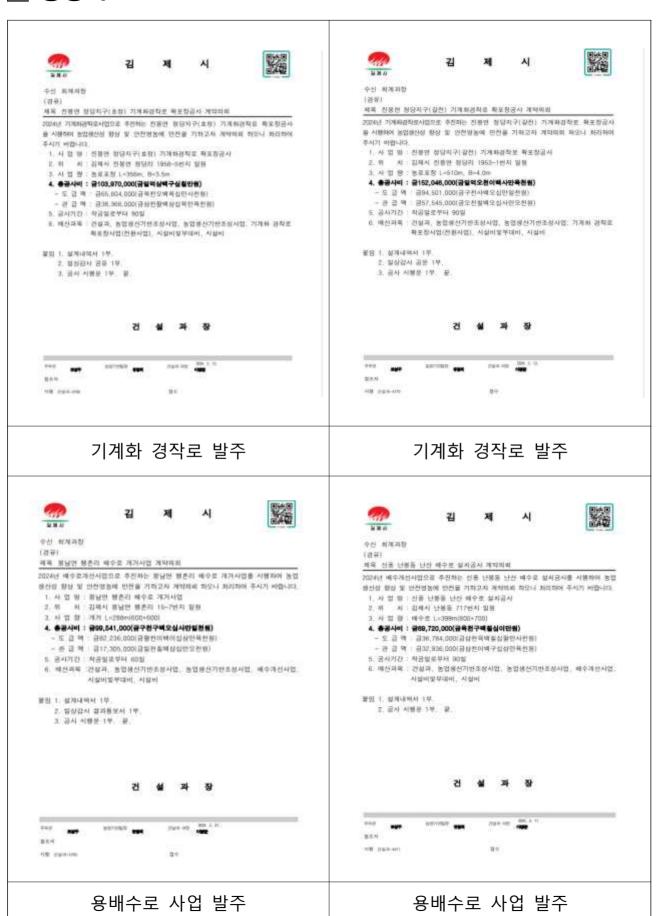



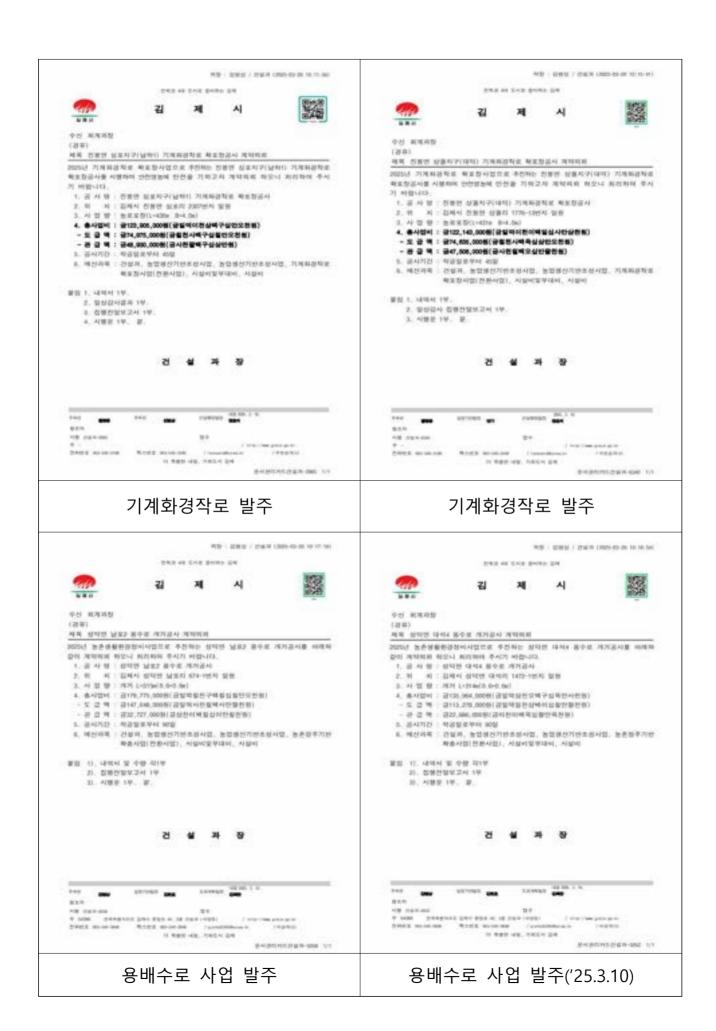







기계화경작로 준공(25.07.16.)
