

관리번호 6		지능형 첨단농기계 실증단지 조성			
완료구분	임기내	사업주체	김제시	추진상황	정상추진
예산구분	109,200백만원	신규여부	계속사업	추진부서/팀 담당자	투자유치과 / 기업지원팀 정나래 (☎ 3980)

□ 추진방향 및 목표

- 내수침체 극복 및 농기계 기술경쟁력 확보를 통한 농기계 수출 활성화
- 지능형 농기계 실증단지를 활용, 첨단농기계 산업 김제 집적화
- 농기계의 고성능·고품질 기술개발을 통한 국내 농기계 산업 육성
- 농기계 실증 지원, 농기계 점인증 지원, 농기계 빅데이터 활용지원

□ 사업개요

- 위 치 : 새만금 농생명용지 5공구 일원 100ha(김제 광활면)
- 사업기간 : 2023 ~ 2027년(5년)
- 사 업 비 : 1,092억원(국비 732, 도비 180, 시비 180)
- 사업내용 : 실증센터(연구동 등) 5ha, 테스트베드(수도작, 밭농업용) 95ha
- 주관기관 : 농림축산식품부
- 시행기관 : 김제시(위탁기관: 한국농업기술진흥원)

□ 자원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22		'23		'24		'25		'26	'26 이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	계획
계	109,200	17,061			2,876	2,876	1,400	1,400	12,785	12,785	23,436	68,703
국비	73,200	11,433			1,927	1,927	940	940	8,566	8,566	15,702	46,065
도비	18,000	2,814			474.5	474.5	230	230	2,109.5	2,109.5	3,867	11,319
시비	18,000	2,814			474.5	474.5	230	230	2,109.5	2,109.5	3,867	11,319
기타												

□ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
사업비 확보	목표(억원)		29	14	128	234
	실적(억원)		29	14	128	
	달성률(%)		100	100	100	

□ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2022	○ 지방재정투자심사 심의 대응 ○ 연차별(23년도) 사업예산 국비 재원 확보 대응	○ 지방재정투자심사(중앙) : 승인 ○ 연차별(23년도) 사업예산 확보 : '22년 12월, 정부예산심의 승인 - 기본 및 실시설계용역 사업예산 : 29억원(국19, 도5, 시5)
2023	○ 추진계획 수립(농식품부) ○ 시행주체 변경 등에 따른 농식품부 기본계획 변경 ○ 세부추진계획 제출 및 승인 ○ 업무협약(김제시↔농진원) 및 구축 사업단(T/F) 구성 ○ 기본 설계용역 착수 ○ 착수보고회 및 Kick-off 회의	○ 추진계획 수립(농식품부) ○ 실증단지 구축 관련 기관(농식품부, 기재부 등) 업무 협의 5회 ○ 시행주체 변경 등에 따른 농식품부 기본계획 변경 ○ 세부추진계획 제출 및 승인 ○ 업무협약(김제시↔농진원) 및 구축 사업단(T/F) 구성 ○ 기본계획 수립 용역 착수 ○ 착수보고회 및 Kick-off 회의
2024	○ 기본계획 수립 ○ 환경영향평가, 건축법 등 인허가 실시 ○ 부지 지반조사 및 항공측량 ○ 기본계획 고시(농식품부) ○ 토목·건축 실시설계 용역 발주 ○ 소규모 환경영향평가 용역 발주 ○ 건설사업관리 용역 발주 ○ 2025년 국가예산 확보 (기재부·국회 대응)	○ 기본계획 수립 ○ 부지 지반조사 및 항공측량 ○ 소규모 환경영향평가 용역 발주 ○ 기본계획 고시 관련 기재부 (총사업비관리과) 협의 ○ 2025년 국가예산 확보 활동 (기재부·국회 대응) ○ 새만금 기반시설 구축(상하수도) 관련 대책 협의 ○ 토목·건축 실시설계 용역 추진

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2025 1분기	○ 기본계획 고시(농식품부) ○ 실증 및 검인증장비 구축계획 수립 추진	○ 기본계획 고시(농식품부) ○ 2025년 세부사업계획 수립 ○ 건축설계, 건설사업 관리 추진을 위한 맞춤형서비스 계약
2025 2분기	○ 소규모환경영향평가 완료 ○ 실증 및 검인증장비 구축 계획수립 완료 ○ '26년 국가예산 확보(기재부·국회 대응)	○ 공공건축심의 및 설계공모 추진 ○ '26년 국가예산 확보(부시장님 농림부방문)
2025 3분기	○ 토목 실시설계 완료 ○ 통합제어장치 설계 및 사업비 산정	○ 2025년 국가예산 확보 활동 ○ 지능형 농기계 실증단지 구축 부지조성 설계용역 중간보고회

□ 금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2025 4분기	○ 실증부지 시공사 선정 및 착공 ○ 설계 적정성 검토 완료에 따른 총사업비 심의 ○ 부지조성을 위한 성토 관급 계약 추진 ○ 2026년 국가예산 확보(기재부·국회 대응)	
2026 이후	○ 종합관리동, 격납고 등 건축 공사 추진 ○ 실증·검인증 장비 및 통합제어장치 구축 ○ 실증·검인증장비 제작현장 등 점검 및 진도관리 ○ 실증부지 및 센터 등 토목·건축공사 완료 ○ 실증단지 준공검사 및 완료	

☐ 증빙자료

연도 : 2022년 4월 29일 14:00:00

농림축산검역본부			
보도자료			
보도 일시	2022. 5. 2.(월)	배포 일시	2022. 5. 2.(월) 09:30
보도 부서	농업생물정책과/농기소재팀	책임자	황 장
		담당자	서기원
		전화번호	044-201-18811
		팩스번호	044-201-18863

지능형농기계실증단지구축사업 예비타당성조사 통과 - 새단공 농생물 용지에 100ha 규모로 조성 -

<주요 내용>

- 《사업내용》 고령농·고령형 지능형농기계 개발을 위한 현장실증 및 안전성을 지원할 수 있는 실증지원센터 및 필드 테스트(Field test) 단지 조성
- 《사업규모》 100ha(장승리원래 5ha, 필드 테스트 단지 95ha)
- 《사업기간》 2023년 ~ 2026년
- 《예비타당성조사결과》 타당성 확보*, 총사업비 1,002억 원

* 비용 대비 편익 분석(B/C) 0.95, 총합불가액의 0.612

농림축산검역본부(장관 김현수, 이하 농검본부)는 4월 29일 기획재정부의 재정사업평가위원회에서 새단공 농생물 용지 일원에 조성될 “지능형농기계 실증단지 구축사업”에 대한 예비타당성조사가 최종 심의·의결되었다고 밝혔다.

지능형농기계 실증단지 구축사업은 고령농·고령형 지능형농기계를 개발하여 농기계 산업에 세계적 농기계산업으로 육성하기 위해 2018년부터 준비하여 기획재정부의 예비타당성조사를 통과하는 결실을 보게 되었다.

지능형농기계는 일반농기계에 인공지능(AI), 자율언제비(AV), 빅데이터 등 정보통신기술(IT) 기술을 융·복합한 자율주행·무인화·자율화 기술이 탑재된 첨단농기계로, 필기, 수초 등 대체에너지 기반으로 전환하는 기술을 포함한 친환경농기계까지 다양한 기술을 집약함으로써 농업 생산성을 제고하는 방향으로 발전하고 있다.

실증단지 구축 예타 통과 (농식품부 보도자료, 2022.5.2.)

농림축산식품부	
전라북도	
수신 집행시(주자출발과)	
(주자)	
제목 2022년 지능형 농기계 실증단지 구축사업 예산안 가내지 발표	

1. 농림축산검역본부 농기소재팀(2022.5.2. 09:30)에 연락함(18811).
2. 고령농·고령형 농기계 개발과 국내 농기계산업의 수출경쟁력 확보를 위하여 농검본부와 협력하고, 농검본부가 “지능형 농기계 실증단지 구축사업”을 추진하고 있습니다.
3. 이를 위하여 “지능형 농기계 실증단지 구축사업”의 2023년도 예산안을 아래와 같이 발표하오니, 원활한 사업추진을 위하여 지체 없이 사업결과에 대한 검토를 주시기 바랍니다.

가. 사업기간 : 2023년~2026년
나. 사업비 : 새단공 농생물용지 5공구(필지 95ha)에 필기 100ha
다. 총사업비 : 1,002억 원(내지 732억 원, 개발비 270억 원)
~ 2023년 사업비 : 2,875백만 원(내지 1,875백만 원, 시비 475백만 원)
라. 사업내용 : 실증단지(100ha, 실증지원센터(5ha) 조성 및 장비구입 등. 원

전라북도 제사

부서명	제출금	부담금(지방세)	부담금(지방세)	부담금(지방세)	부담금(지방세)
농림축산	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875
시정	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875
군정	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875
읍정	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875
면정	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875

전라북도 주력산업과 공문 (도 주력산업과-4556, 2022.9.16.)

농림축산검역본부	
전라북도	
수신 집행시(주자출발과)	
(주자)	
제목 2022년 제4차 지방재정 중앙투자심사 결과 발표	

1. 농림축산검역본부 농기소재팀(2022.11.2. 09:30)에 연락함(18811).

2. “지능형농기계 실증단지” 및 “지능형 농기계 실증단지” 예산안 가내지 발표하오니, 원활한 사업추진을 위하여 지체 없이 사업결과에 대한 검토를 주시기 바랍니다.

3. 이를 위하여 “지능형 농기계 실증단지 구축사업”의 2023년도 예산안을 아래와 같이 발표하오니, 원활한 사업추진을 위하여 지체 없이 사업결과에 대한 검토를 주시기 바랍니다.

발표 2022년 제4차 지방재정 중앙투자심사 결과 1부. 원

‘22년 제4차 지방재정 중앙투자심사 결과						
번호	투자명	사업명	예산	사업비	예산	
					내역	비율
1	농기	지능형 농기계 실증단지	2,875	2,875	2,875	100%
2	농기	지능형 농기계 실증단지	2,875	2,875	2,875	100%
3	농기	지능형 농기계 실증단지	2,875	2,875	2,875	100%

농기소재팀(2022.11.2. 09:30)에 연락함(18811).

“지능형농기계 실증단지” 및 “지능형 농기계 실증단지” 예산안 가내지 발표하오니, 원활한 사업추진을 위하여 지체 없이 사업결과에 대한 검토를 주시기 바랍니다.

이를 위하여 “지능형 농기계 실증단지 구축사업”의 2023년도 예산안을 아래와 같이 발표하오니, 원활한 사업추진을 위하여 지체 없이 사업결과에 대한 검토를 주시기 바랍니다.

전라북도	
수신 집행시(주자출발과)	
(주자)	
제목 2022년 제4차 지방재정 중앙투자심사 결과 발표	

1. 농림축산검역본부 농기소재팀(2022.11.2. 09:30)에 연락함(18811).

2. “지능형농기계 실증단지” 및 “지능형 농기계 실증단지” 예산안 가내지 발표하오니, 원활한 사업추진을 위하여 지체 없이 사업결과에 대한 검토를 주시기 바랍니다.

3. 이를 위하여 “지능형 농기계 실증단지 구축사업”의 2023년도 예산안을 아래와 같이 발표하오니, 원활한 사업추진을 위하여 지체 없이 사업결과에 대한 검토를 주시기 바랍니다.


발표 2022년 제4차 지방재정 중앙투자심사 결과 1부. 원

전라북도 예산과 공문 (도 예산과-10683, 2022.11.2.)

‘22년 제4차 지방재정 중앙투자심사 결과

지능형 농기계 실증단지 구축계획

2023. 7.



2023. 8.

부서	담당자	주요내용	구축계획	구축기간	구축예산	구축장소
농식품부	김제시	지능형 농기계 실증단지 구축	2023. 8. ~ 2024. 2. 28.	2023. 8. ~ 2024. 2. 28.	2023. 8. ~ 2024. 2. 28.	2023. 8. ~ 2024. 2. 28.

- 지능형 농기계 실증단지 구축 - 세 부 추 진 계 획 [안]




농식품부 지능형 농기계 실증단지
구축계획 변경('23.7.)

지능형 농기계 실증단지 구축
세부계획 수립('23.8.)



국가예산 확보 활동 -
경제복지국장('23.9.)

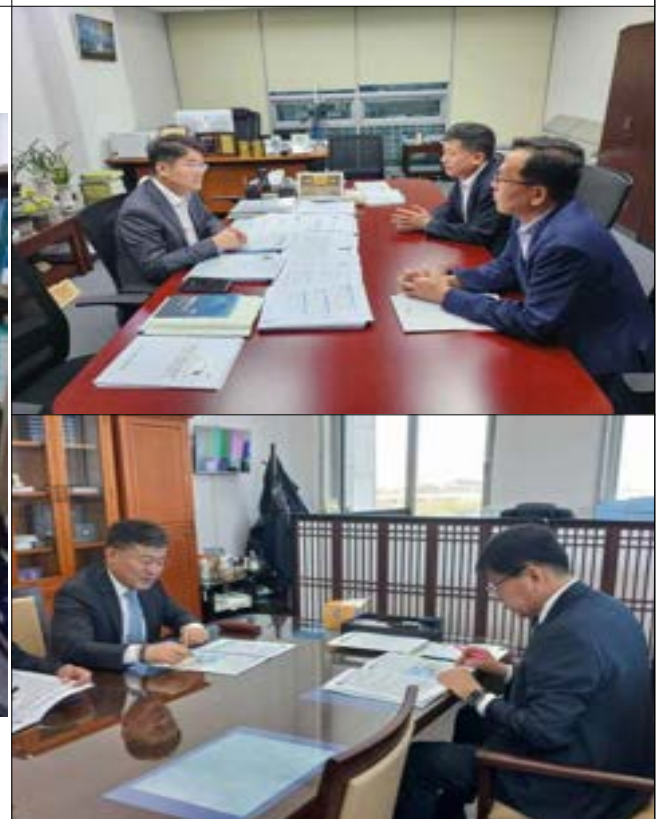

2024년 국가예산 확보 활동 -
김제시장('23.9.~11.)





수산·내부경제
 (경무)
 제1차 : 2024. 7. 15.(월), 11:30~13:30 / 한국농업기술진흥원 농정영ICT집합훈련장
 제2차 : 2024. 7. 16.(화), 14:30~16:30 / 기획재정부 총사업비관리과
 지능형 농기계 실증단지 구축 관련 출장 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 일시/장소
 - 1차 : 2024. 7. 15.(월), 11:30~13:30 / 한국농업기술진흥원 농정영ICT집합훈련장
 - 2차 : 2024. 7. 16.(화), 14:30~16:30 / 기획재정부 총사업비관리과
 2. 참 석 자
 - 1차 : 기업지원팀장, 농정영 ICT팀장 외 2명
 - 2차 : 기획재정부 김민석 사무관, 농식품부 이현 사무관, 기업지원팀장, 농정영 ICT팀장 외 2명
 3. 주요내용 : 지능형 농기계 실증단지 구축사업 총사업비 관련 협의
 - 기획재정부 수석 경제관료인 기획재정부 사전집회(24.5.)를 하였으나, 기획재정부에서 **기초계획(23년)총사업비 조달** 불수용
 - 이에 **기초계획을 예비 단계 계획으로 수정** 후 기획재정부(총사업비관리과)에 협의
 4. 김재서 및 부관가관(농식품부, 농정영) 요구사항
 1) 사업기간 연장
 - 새만금 농정영 유치 농업기술 공공(내부개발사업)의 지원(23년~27년) 및 건축 공사기간(23년~26년) 고려 시 **사업기간 연장 필요(2024~27년)**
 2) 사업비 조달
 - 총사업비 연등분 납입과, 상·하수도 시설설치 분담금 납부금 회피 **예비비 총 납부(2,412백만원)를 공사비로 전용**
 5. 기획재정부(총사업비관리과) 의견
 1) 사업기간 연장
 - 반영가능
 2) 사업비 조달
 - 예비비는 **기초계획 수립시 계획되는 항목으로, 항목간 조달이 아닌 요구내역에서 채택**되어야 하며, **분담금 납부 등 필요한 사업에는 요구 시 검토** 후, 반영여부 결정
 총사업비 관리지침 제2075(관리대상 사업내역의 동종제4항 계약자입금조치 금지) 반영은 제외
 이는: 기초계획의 수은, 기본설계 및 사업 총으로 인해 사업에 대한 비용 총액이 확정되는 단
 계에서 계획하고 그 이후 예비비가 총사업비로 확정되는 아니하도록 하여야 한다.


결 과 보 고 서
 농정영 부지조성(토목) 설계 관련 회의 결과보고서
 지능형 농기계 실증단지 구축 관련 출장 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 일 시 : 2024. 8. 9.(월), 14:00 ~ 14:30
 2. 장 소 : 김재서팀 상하수도과
 3. 참 석 자 : 기업지원팀장, 상하수도팀장, 하수관리팀장, 농정영 ICT팀장 외 5명
 4. 주요내용 : 새만금 사업지역 상하수도 설치사업 일정 지원에 따른 지능형 농기계 실증
 단지 구축사업 상하수도 시설(설비) 대책 논의
 가. 상수도
 - 산업청, 농정영과 기업지원과 3자에서 상수 공급(연입) 공사를 추진할 계획
 (예산공적분할 사전승인 후) 사업비 50%의 정도 예상
 - 실증단지 구축 사업도 상수 공급(연입) 사업에 참여할 수 있도록 안내
 (농정영은 정부 차의 세 가지 역할)
 - 일자 : ① 상수 공급(연입)공사 관련 **비전(2025년)에 따라** (2024년말, 2025년말)
 ② 상수도 공급(연입) 공사 참여 요청(부지관리과→상하수도과)
 나. 하수도
 - 자체 철거시설 설치사용 후 새만금 사업지역 하수도시설 연결 강구 필요
 - 계획 수모형(1:50/100)의 합치 않고 배출기준(300수)에 적합할 것으로 판단
 다. 향후계획
 - 새만금 지역 사업 상하수도 관련 회의 개최(새만금관리청과(24.8월말))
 5. 관련사진



지능형 농기계 실증단지 구축
관련 기재부 협의('24.7.)

새만금 기반시설 구축(상하수도)
관련 대책 협의('24.8.)

대한민국 대전광역시 서구
 청사 1800문555 000

 TEL. 053-4006-7500
 FAX. 053-400-3372

기술용역 입찰설명서
 관리번호 : 2491318-00
 용 역 명 : 지능형농기계 실증단지 부지조성 설계(기본 및 실시)용역
 개찰일시 : 2024. 11. 20. 11:00
 수요기관 : 한국농업기술진흥원

1. 이 입찰공고는 조달청이 발행하는 입찰청서 발행일 및 낙찰자가 속지하고
 준수하여야 할 사항을 기재한 문건으로서, 모든 입찰청서자는 이를 철저히 지켜
 합니다. 이 문건 관련하여 문의할 사항이 있을 경우에는 조달청 정부조달물
 센터(전화번호 1588-0800)로 연락하여 주시기 바랍니다.
 2. 본 입찰에 관련하여 비리·불공정행위가 있는 경우 건실기술계약(020-4006-7500)
 및 조달청 홈페이지(www.pps.go.kr) → 참여·연계 →조달신문고 →진상·견제를
 통하여 신고 할 수 있습니다.
 3. 본 입찰 및 계약과 관련하여 조달청 직원에 금품, 향음 등 부당한 요구를 할
 경우 조달청 행정감행책임담당관(진상담당)에게 신고하여 주시기 바랍니다.



지능형 농기계 실증단지 구축
부지조성(토목) 설계 추진('24.11.)

2025년 국가예산 확보 활동 -
투자유치과장('24.11.)

농림축산식품부 고시 제2025-8호

종사업비 관리지침 제14조에 따라 다음과 같이 지능형 농기계 실증단지 기본계획을 고시합니다.

2025년 1월 6일
농림축산식품부장관

지능형 농기계 실증단지 기본계획 고시

1. 사업의 목표

- 농기계 산업 육성과 수출 산업화 달성을 위한 고성장·고성능 농기계 및 중·대형 트랙터 개발을 위한 실증단지 조성

2. 사업의 기본방향

- 지능형 농기계 실증단지는 미래 농기술 기반으로 개발된 제품을 상용화 전에 실험·검증·검정·평가 및 안전성 등을 검증하는 장소
- 노거 농기계 성능 및 품질 향상을 위한 후속 연구개발 기회를 확보하고, 원천농업 실험을 위해 타 산업과 융복합 및 기능확충 통해 농기계에 소요성

지능형 농기계 실증단지 기본계획 고시('25.1.)

2025. 01.

문서번호	부처/유치부	주무관	기밀지정	부처/유치부	사안결정	부처/유치부	시행	시행
보통기간								
결재일자	2025. 1. 6.							
결재처								

지능형 농기계 실증단지 구축사업 2025년 세부추진계획(안)

김 제 시
투 자 유 치 과

지능형 농기계 실증단지 구축 2025년 세부추진계획 수립('25.1.)



결 과 보 고 서

문서번호: 농림축산식품부-115

제 목: 지능형 농기계 실증단지 구축 관련 회의 결과보고('25. 1. 13.)

지능형 농기계 실증단지 구축 관련 회의 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 일 시 : 2025. 1. 13.(월) 10:00~10:30
2. 장 소 : 투자유치과 사무실
3. 참 석 자 : 투자유치과장, 기업지원팀장, 한국농업기술진흥원 ICT팀장 제 4명
4. 주요내용 : 실증단지 구축 2025년 세부추진계획, 국가예산 확보 관련 논의

가. 2024년 주요추진사항

- 기본계획 수립('24.3.)
- 실증단지 상수도 인입 설계 착수('24.11.)
- 부지조성 설계 용역 착수('24.12.)
- 종사업비 협의 및 기본계획 고시('25.1.)

나. 2025년 주요추진계획

- 부지조성 설계용역 추진('25.8.)
- 건축설계 용역 추진('25.1.)
- 실증단지 설계 완료에 따른 종사업비 협의('25.9.)
- 부지조성 공사 시공사 선정 및 착공('25.11.)

다. 당부사항: 투자유치과-농진원

- 금년 착공을 위해서는 농진원 행정청장 허부, 행정청장 전담 세 사안 검토 및 협의 등 공문한 확인이 필요한 행정청장 지원으로 인해 해당 지원되지 않도록 일부
- 지자체와 양각한 재정여건을 고려하여, 추가적인 사업비 부담 및 향후 운영에 부담이 없도록 일부
- 농진원 : 농기계 집안중 비품으로 운영비 송금 및 부족 운영비는 농식품부 예산 사용하도록 사정규칙 제정할 계획

5. 관련사진



지능형 농기계 실증단지 구축 2025년 세부추진계획 관련 회의('25.1.)



조 달 청

농림축산식품부

수신 한국농업기술진흥원
(경유)

제목 '맞춤형서비스' 약형(안) 송부(지능형 농기계 실증단지 구축사업)

1. 문형지원실-2025(2024. 11. 25.), "맞춤형서비스" 약형제출 요청(보통) (지능형 농기계 실증단지 구축사업) 관련입니다."

2. 위 기관에서 추진 중인 "지능형 농기계 실증단지 구축사업"이 맞춤형서비스(기획설계) 요청에 대하여 위 기관과 우리 청의 업무범위를 청하기 위해 [붙임1]과 같이 맞춤형서비스 약형제(안)를 송부하오니, 이에 대한 동의 여부를 회신하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 본 사업의 예산을 검토한 결과 [붙임2]사업추진계획서와 같이 예산 부족이 예상되오니, 약형제(안) 동의 시에는 추후 부족예산을 확보하거나 설계내용을 조정하여야 함을 알려드리며, 예산문제 등으로 사업추진에 중대한 문제가 발생하는 경우 맞춤형서비스 약형을 제지할 수 있음을 알려드립니다.

붙임 1. 맞춤형서비스 약형제(안) 1부,

2. 사업추진계획서(안) 1부, 끝.

조 달 청 장



주무관 김용배 사무관 서정복 차장서(안) 2025. 1. 13.
보조자
서명: 서정복(가) 2025. 1. 13. (인)
부 30347 대전광역시 서구 둔촌로 189 3층, 3층(농진원, 3층) / www.pda.go.kr
전화번호: 010-4056-7384 팩스번호: 0505-680-1229 / kdk@n110.com / (비밀)

건축설계, 건설사업관리 관련 맞춤형서비스 계약('25.3.)

 결과보고서 농서번호: 농자유치과-0006 제 목 지능형 농기계 실증단지 구축 관련 회의 결과보고(25. 4. 8.) 지능형 농기계 실증단지 구축 관련 회의 결과를 아래와 같이 보고합니다. 1. 일 시 : 2025. 4. 8.(목) 09:30~10:30 2. 장 소 : 한국농업기술진흥원 농경량ICT융합센터 3. 참 석 자 : 도 부러기개발팀, 시 기업지원팀장, 농진원 ICT팀장 과 5명 4. 주요내용 : 지능형 농기계 실증단지 구축 관련 회의 가. 그간 추진상황 및 향후계획 - 토목설계 : 착수(24.12.3) → 중간보고회(일정 협의) → 토목 계획서(25.11.~12.) 예정 - 건축설계 : 조달청 입찰청사서스 계약(25.3.) → 공공건축설계-설계공모(25.5.) → 조달청주(25.7.) 예정 나. 사업기간 연장 및 '26년 국가확보 논의 - 기존 기간(-27)대로 추진 시 향후 2년 간 국비 부담이 커 기재부 측에서 사업기간 연장(-28) 요청 - 해당할 경우(농진원) : 향후 사업(28), 현재 사업에 따른 국비 지원에 부담 가중 등을 감안함 → 예, 사업기간 연장론 불가로 일단 - 사업기간 연장으로 인한 '26년도 국비는 당초 158억원에서 110억원 확보로 변경 [부회 단계 110억+실용비 48억, 농식품부 방문 추진(전북도-김제시)] 5. 관련사진 	 결과보고서 농서번호: 농자유치과-0006 제 목 지능형 농기계 실증단지 구축 관련 국가예산 확보 출장 결과보고(2025.4.15.) 지능형 농기계 실증단지 구축 관련 국가예산 확보 출장 결과를 아래와 같이 보고합니다. 1. 일 시 : 2025. 4. 15.(목), 14:00 ~ 14:30 2. 장 소 : 농림축산식품부 첨단기자재총과 3. 출 장 자 : 부시장, 투자유치과장, 기업지원팀장, 주무관 등 4. 연 락 자 : 첨단기자재총과장, 이영동 주무관 4. 주요내용 : 지능형 농기계 실증단지 구축사업 관련 2026년 국가예산 지원 건의 가. 지능형 농기계 실증단지 구축사업 현황 보고 - (농식품부 과장) 어떻게 포항 출제 사업되는 일이며, 사업에 집행 가능한 지? → 출제 사업비(국비)는 어떻게 포항 102억이며, 예정대로 토목 공사, 건축설계용역 등 추진 시 사업비 부담은 어떻게 될까 최소비용으로 요청 나. 2026년 국가예산 지원 관련 건의 - (농식품부 과장) 국비 요구액은 어떤 기준으로 산출했는지? → 당초 계획 예산은 150억 원이나, 정부 건축예산 감소에 따라 농식품부-전북도-김제시-농진원 등 기관간 사전 협의를 통해 최소 국비 110억원 지원 필요함 5. 관련사진 
지능형 농기계 실증단지 구축 업무 협의('25.4.)	2025년 국가예산 확보 활동 - 부시장('25.4.)
 결과보고서 농서번호: 농자유치과-0007 제 목 지능형 농기계 실증단지 구축 관련 국가예산 확보 출장 결과보고(2025.7.22.) 지능형 농기계 실증단지 구축 관련 국가예산 확보 출장 결과를 아래와 같이 보고합니다. 1. 일 시 : 2025. 7. 22.(목), 14:00 ~ 14:30 2. 장 소 : 농림축산식품부 첨단기자재총과 3. 출 장 자 : - 도 : 미래형산업농업 전환실용과 부러기개발팀(노익원), 주무관(한우희) - 시 : 융합과 투자유치과장, 김경미 기업지원팀장, 한나래 주무관 4. 연 락 자 : 농림축산식품부 첨단기자재총과장 이현 사무관, 송수현 주무관 5. 주요내용 가. 지능형 농기계 실증단지 구축사업 관련 회의 ○ 지능형 농기계 그간 추진상황 및 향후계획 - 토목설계 : 착수(24.12.1) → 중간보고회(일정 협의) → 토목 계획서(25.11.~12.) 예정 - 건축설계 : 조달청 입찰청사서스 계약(25.3.) → 공공건축설계-설계공모(25.5.) → 조달청주(25.7.) ○ 총사업비 요청 심의(25.8.~25.9. 예정) ○ 2026년 국가예산 지원 관련 건의 - '26년도 국비는 110,700원 요구(2025.4. 기재부 1차 심의시 9,600원 삭감) 101,200원으로 결정됨 ○ 사업사용 : 정부 민생소비 푸른 일상에 지원 예산부족 나. 지능형(AG) 농업로봇 국가산업단지 조성, 일리보달 시 기반 시설사업 로봇 원-푸드 센터 구축 및 시 용달형 푸른로드 전주기 지능형 농기계 구축 건의 등 6. 향후계획 : 해당 예산액에 대해 전년도와 협의 후 대응방안 마련, 등. 2025. 7. 22. 김 제 시 장 귀하 부처장 김나래 기업지원팀장 김경미 투자유치과장 주무관 농자유치과장 송수현 농진원	 결과보고서 농서번호: 농자유치과-0008 제 목 지능형 농기계 실증단지 구축 부지조성 설계용역 중간보고회 참석 결과보고(2025.8. 8.) 지능형 농기계 실증단지 구축 부지조성 설계용역 중간보고회 참석 결과를 아래와 같이 보고합니다. 1. 일 시 : 2025. 8. 6.(수) 14:00 ~ 16:00 2. 장 소 : 한국농업기술진흥원 3. 참 석 자 : 농식품부, 전북도, 김제시, 농진원, 용역자 20명 4. 주요내용 : 부지조성 공사 연차가 서항 및 송사읍비(1,017억원) 포함 관련 협의 등 5. 결렬사항 ○ 부지조성 공사 용가상승분 반영(25. 8월 기재부 송사읍비 협의 대응 방안 논의 - 실용 건축부지 공사도 용역함으로 부지조성 공사 토사 반입비용 절감하여 송사읍비 항목분 최소화 ○ 송사읍비 기존 부지조성 공사에: 202.8억원 (원안 공사비) 사업비 348.5억원  (대안1 공사비) 사업비 271.8억원  * 송사읍비 : 1,017억, 부지 7,770㎡ (140필지) * 용역비 : 141.2억 ~ 41.40억, 용역자 : 20명 ~ 25.4.000명 * 용역비 : 141.2억 ~ 41.40억, 용역자 : 20명 ~ 25.4.000명
2025년 국가예산 확보 활동 투자유치과장 ('25.7.)	지능형 농기계 실증단지 구축 부지조성 설계용역 중간보고회('25.8.)
