관리번호 46	대중교통 운수종사자 교통 쉼터 조성							
완료구분	임기내	사업주체	김제시	추진상황	이행 후 계속 추진			
예산구분	155백만원	신규여부	신규사업	추진부서/팀 담당자	교통행정과 / 교통행정팀 라병오 ( <b>53:</b> 3754)			

## □ 추진방향 및 목표

- O 도심 내 대중교통 운전기사 쉼터 조성 추진
  - 김제역 광장 등 7개소에 편의시설(냉·난방기 등)을 갖춘 쉼터 조성

### □ 사업개요

O 사 업 명: 대중교통 운수종사자 쉼터 조성사업

○ 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 12.

O 사 업 비 : 155백만원

○ 사업위치 : 신풍동 13-17번지(김제역 광장) 외 7개소

○ 사업내용 : 김제역, 터미널, 전통시장, 사자탑 승강장 등에 각종

편의시설(냉・난방기 등)이 완비된 교통 쉼터 조성

### \_\_ 재원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22		'23		'24		'25		'26	'26 이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	계획
계	155	146	35	35	30	30	30	31	30	50	30	
국비												
도비		50								50		
시비	155	96	35	35	30	30	30	31	30		30	
기타												

## □ 공약달성 확인지표

구분	'22	'23	'24	'25	'26	
대중교통 운수종사자	목표(개소)	1	2	2	2	1
	실적(개소)	'23년 추진	3	4	1	
교통쉼터 조성	달성률(%)		150	200	50	


# \_\_ 그간 추진사항

구 분	추진계획	<b>추진사항</b> (실적)
2022	○ 김제역 광장 내 운수종사자 교통 쉼터 설치	○ 김제역 광장 내 운수종사자 교통 쉼터 조성에 따른 사업대상지 현장답사('22.11.) - 운수종사자 요청사항 반영 ○ 2023년 상반기 사업 추진
2023	○ 전통시장 대중교통 쉼터 설치 ○ 김제역 광장 내 운수종사자 교통 쉼터 설치 ○ 만경터미널 앞 복합교통쉼터 조성	<ul> <li>○ 운수종사자 의견 수렴('23.2)</li> <li>○ 김제역 광장 내 교통 쉼터 설치 위치 확정('23.2.)</li> <li>○ 전통시장 대중교통 쉼터 착공 및 준공('23.2.)</li> <li>○ 김제역 광장 내 교통 쉼터 설치사업 착공 및 준공('23.3.~6.)</li> <li>○ 만경터미널 앞 복합교통쉼터 착공 및 준공('23.5.~10.)</li> </ul>
2024 1분기	○ 대중교통 쉼터 설치	○ 시청오거리 대중교통 쉼터(2호점) 조성사업 착공('24.3.)
2024 2분기	○ 대중교통 쉼터 설치	○ 시청오거리 어울림쉼터(2호점) 준공('24.4.)
2024 3분기	○ 대중교통 쉼터 설치	○ 택시승강장 교통 쉼터 조성 - 대상지(3개소) : 터미널 앞, 부영 3차, 교동휴먼시아아파트
2024 4분기	○ 대중교통 쉼터 7개소 완료	○ 전통시장, 시청오거리, 만경터미널 ○ 김제역, 터미널, 부영3차, 교동휴먼시아
2025 1분기	○ 시내버스 운수종사자 기사식당(1개소) 조성	<ul><li>○ 시내버스 운수종사자 기사식당(1개소) 조성</li><li>- ('25. 2.) 도비보조금 교부신청</li><li>- ('25. 3.) 도비보조금 교부결정 및 송금(도→시)</li></ul>
2025 2분기	○ 시내버스 운수종사자 기사식당(1개소) 조성	○ 시내버스 운수종사자 기사식당(1개소) 조성사업 추진 협의
2025 3분기	○ 시내버스 운수종사자 기사식당(1개소) 조성	○ 시내버스 운수종사자 기사식당(1개소) 조성 - (`25. 9.) 지방보조사업자 사업 신청 및 착수


## □ 금후 추진계획(로드맵)


구 분	추진계획	비	고
2025 4분기	<ul> <li>○ 시내버스 운수종사자 기사식당(1개소) 조성</li> <li>- ('25. 10.) 사업완료 및 정산서 제출(사업자→시)</li> <li>- ('25. 10.) 보조사업 정산 및 잔액(이자) 반납(사업자)</li> <li>- ('25. 11.) 정산보고(시→도)</li> </ul>		
2026 이후	○ 도비보조금 잔액(이자) 반납(시→도) ○ 운수종사자 교통 쉼터 8개소 유지관리		

## \_ 증빙자료

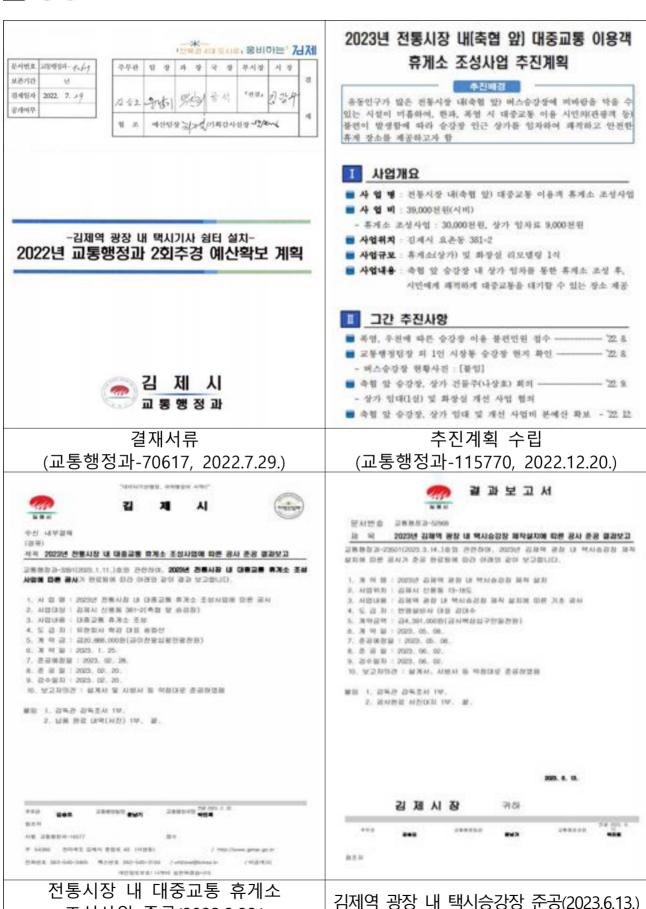

조성사업 준공(2023.2.22.)





2023년 3분기 전통시장 교통쉼터 환경정비 공공근로 계약서('23.7.3.)

-수선 내부경제 (選条) 서찍 2023년 도심 내 책합교통원테송강장) 조성사업 시행(명시어별) I. 교육병원급-05910(2023.4,20.)호장 관련됩니다. 2. 도입 내 다음교육 이용시간의 전성 증진을 위해 2020년 도입 내 독립교육입다(승권장) 조망사업을 이경한 같이 시용하고자합니다. 가. 사 입 명 : 2020년 도립 내 독립교통원단(승강원) 조선사업(명사인물) 나. 사업 비 : 급197,890,000원(급일역구원활벽광십구만원) - 6강원 경작(관급) : 급173.830.000원(급당역원원성역공입성안원) 용경용 공사(도급) : 급 24.000,000명(급대한시백력한원) D. ABNO: NOWEVER OUR DUR 라. 보안과목 : 교통점성과, 대통교통 유난지장, 대통교통기반조성 및 온수다게지만, 대흥교육 기반조성, 시설바맞무대비, 시설비(경시이용) **製製 1. 本が光巻 19.** 2. MINUR IV. 3. 영상경사 결과 내적 1부. 광.

2023년 도심 내(만경터미널 앞) 복합교통 쉼터 조성사업 시행(2023.4.24.) 2024년 대중교통 어울림 쉼터 확대 조성사업 계획 수립(2023.11.16.)





2023년 도심 내(만경터미널 앞) 복합교통 쉼터 착수 및 준공(2023.10.24.)







2024년 시청오거리 대중교통 어울림 쉼터 조성사업 시행(2024.3.12.)

2024년 시청오거리 대중교통 어울림쉼터 조성 완료(2024.4.1.)







터미널 앞 택시승강장 외 2개소 시설 개선 사업을 통한 운수종사자 교통 쉼터 조성(2024.7.22.)

